

MVOGMBI_Sync — Diagramme de projet

Version 1.0.7 (6 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke. Plus de 140 versions livrées en 13 jours, chacune avec son installateur ; numérotation remise à 1.0.0 le 5 novembre 2026.

1. Planning réalisé (Gantt)

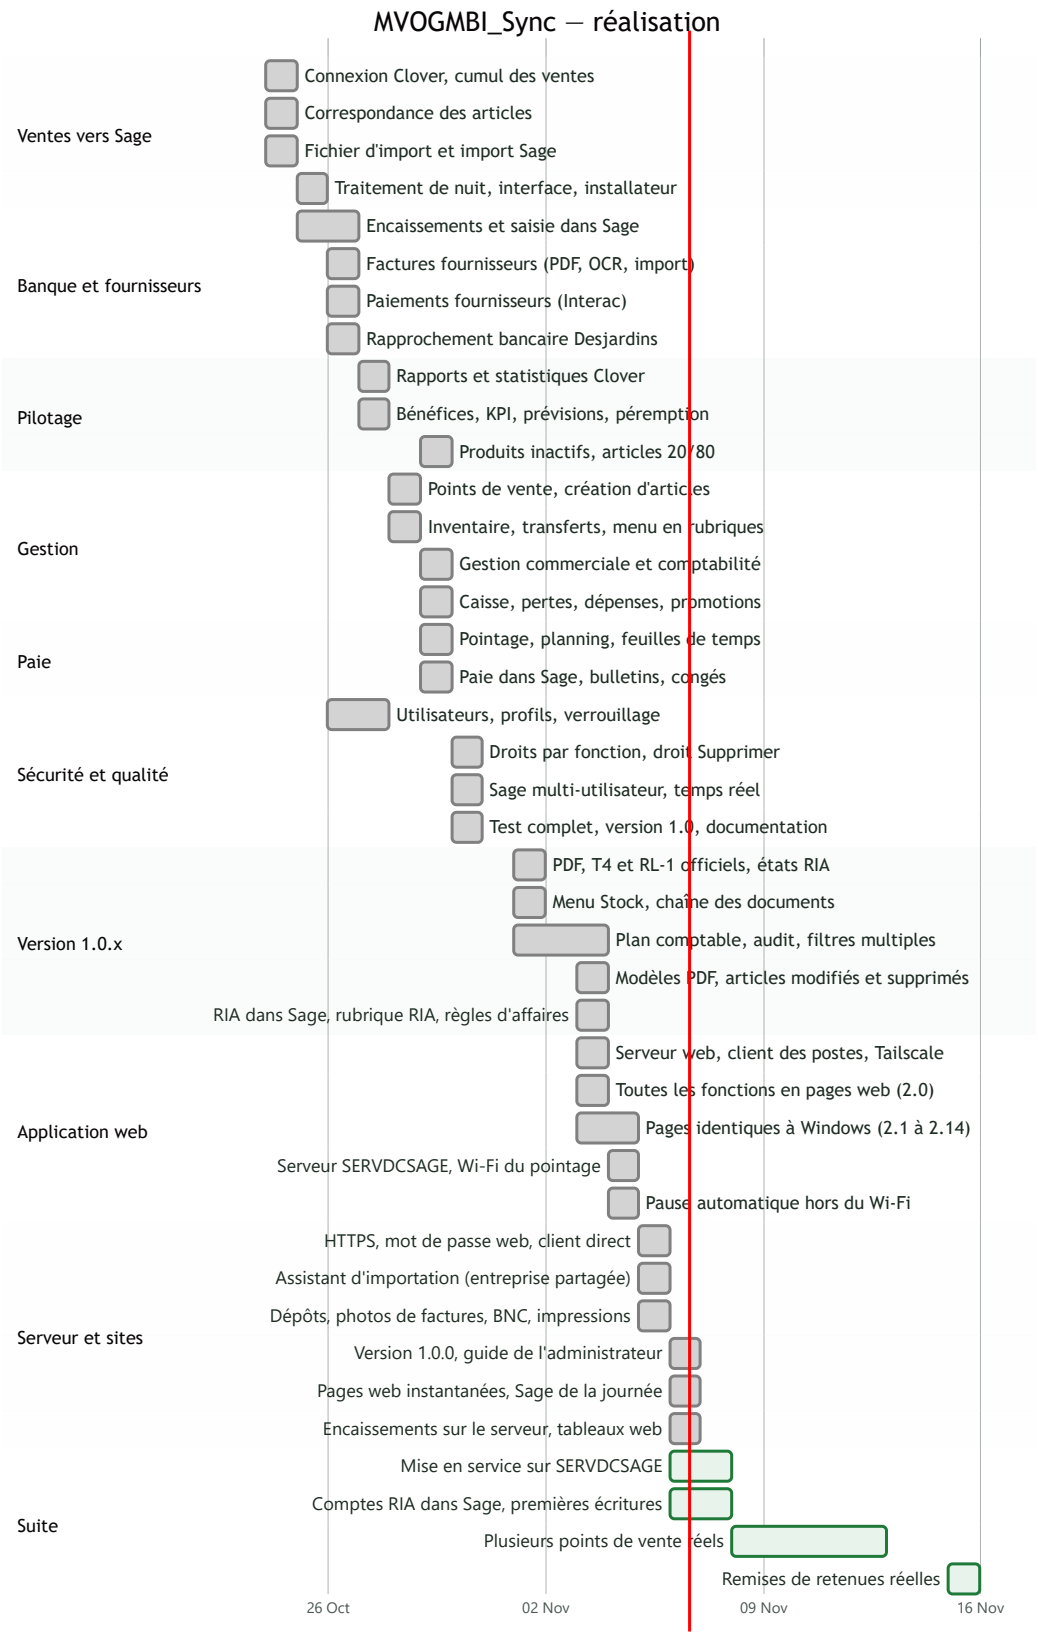

2. Découpage du produit

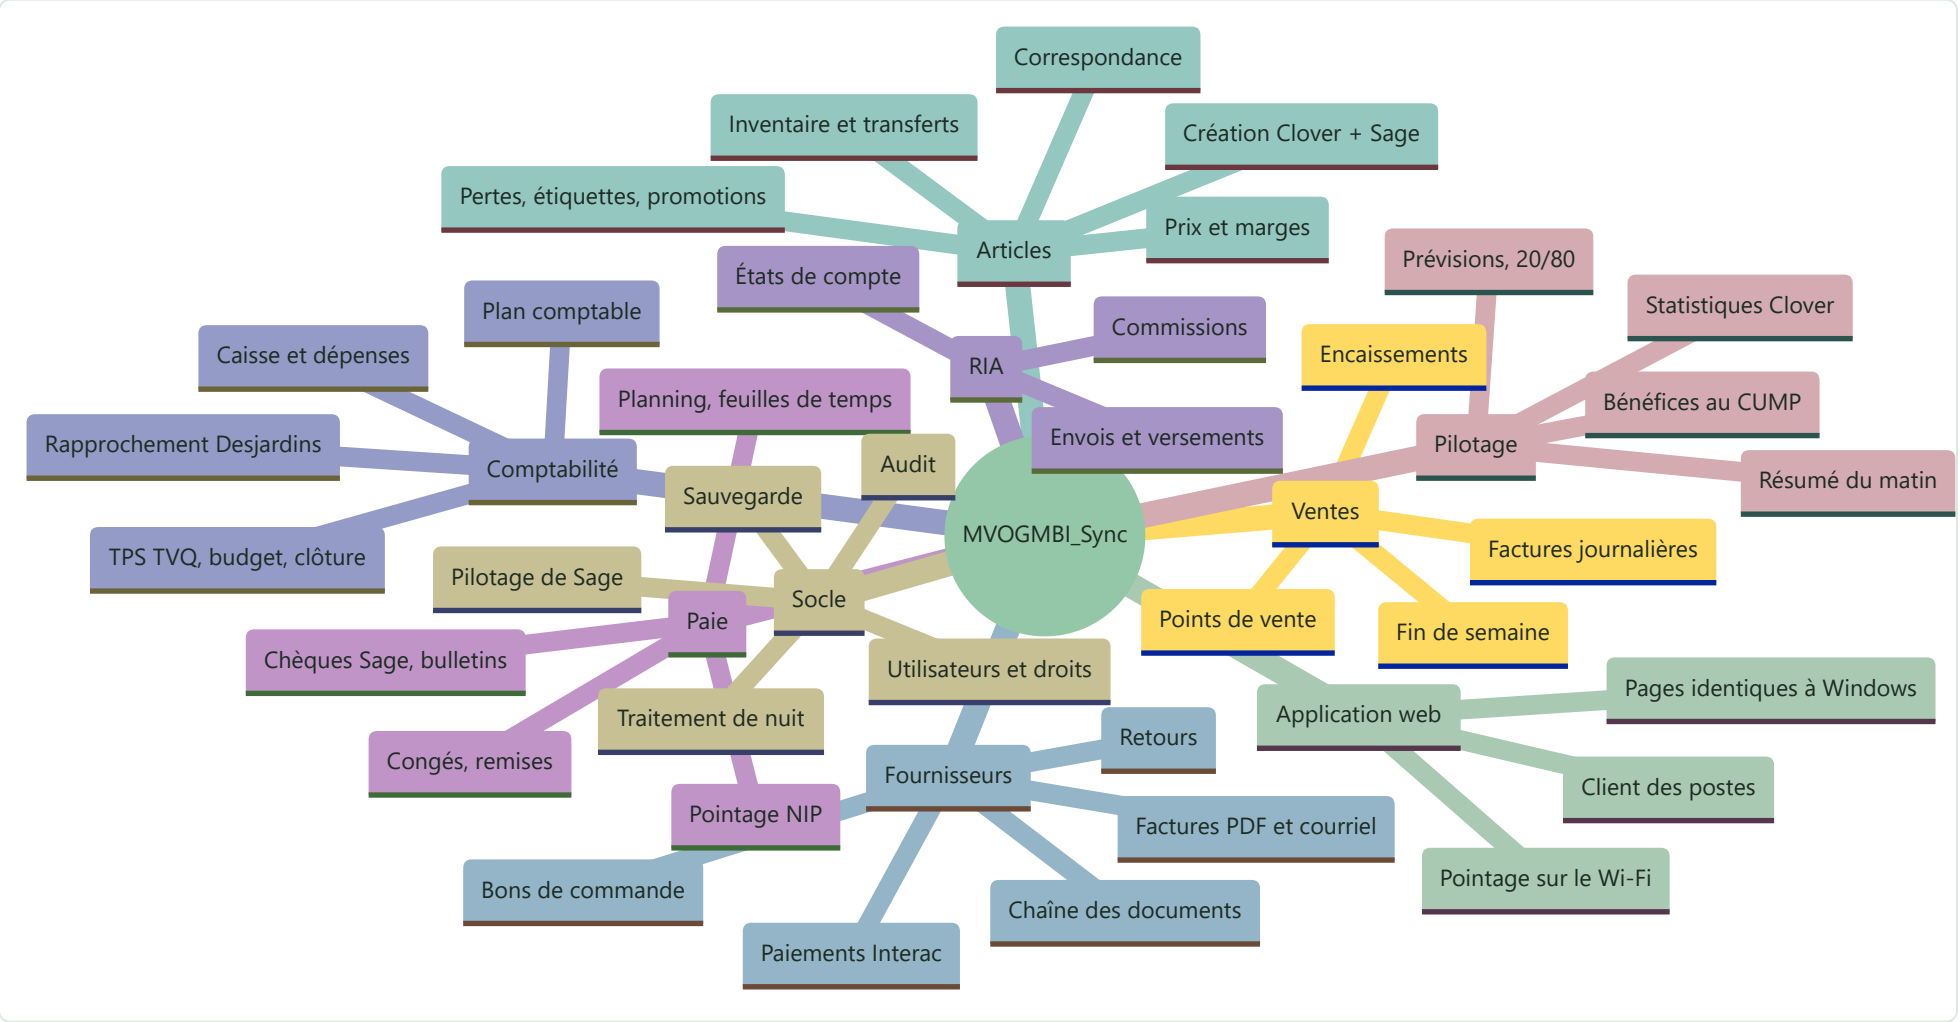

3. Jalons

Date	Jalon	Version
24 oct. 2026	Premier import automatique réussi dans Sage	étape 4
25 oct. 2026	Traitement de nuit, installateur Windows	1.3.0
26 oct. 2026	Encaissements la nuit, fournisseurs, rapprochement	1.7.0 à 1.9.11
27 oct. 2026	Statistiques et rapports comme Clover	1.9.12 à 1.9.29
28 oct. 2026	Points de vente, articles, inventaire, transferts	1.10 à 1.22
29 oct. 2026	Gestion commerciale, comptabilité, paie	1.23 à 1.45
30 oct. 2026	Droits par fonction, multi-utilisateur, temps réel, test complet	1.46.3
30 oct. 2026	**Version 1.0.0** : numérotation remise à zéro, documentation complète	1.0.0
30 oct. 2026	Rapports de gestion, services dans Sage seulement, lecture des paies de Sage	1.0.1 à 1.0.3
1er nov. 2026	PDF de secours, T4 / RL-1 officiels, états RIA, menu Stock, chaîne des documents, plan comptable, audit	1.0.4 à 1.0.7
3 nov. 2026	Modèles PDF, articles modifiés et supprimés, RIA dans Sage, rubrique RIA, règles d'affaires, documentation à jour	1.0.8 à 1.0.11
3 nov. 2026	Application web (serveur, client, toutes les fonctions)	1.1.0 à 2.0.0
3-4 nov. 2026	Pages web identiques à Windows : audit des boutons, comparaison côte à côte	2.1.0 à 2.14.1
4 nov. 2026	Nouveau serveur SERVDCSAGE, serveur réglable, app.marchemvogmbi.com, pointage sur le Wi-Fi du magasin	2.14.2
4 nov. 2026	Pause automatique d'un téléphone hors du Wi-Fi du magasin, documentation à jour	2.15.0
5 nov. 2026	Comptes activés / désactivés, prix de vente Sage depuis Clover, HTTPS sans port, mot de passe web solide	2.15.1 à 2.17.0
5 nov. 2026	Suivi des feuilles de temps, client ouvert directement, serveur web sans fenêtre	2.17.1 à 2.18.0
5 nov. 2026	**Premier import dans le vrai fichier partagé** par l'assistant d'importation de Sage	2.19.0 à 2.22.1

Date	Jalon	Version
5 nov. 2026	Dépôts (plusieurs sites), photos de factures, même état Windows / web, relevés BNC, comptes bancaires, modèles d'impression	2.20.0 à 2.24.2
5 nov. 2026	**Version 1.0.0** : numérotation remise à zéro	1.0.0
6 nov. 2026	Documentation complète à jour et guide de l'administrateur	1.0.1
6 nov. 2026	PDF de la documentation lisibles : diagrammes à la bonne taille, pages en largeur, titres gardés avec leurs diagrammes	1.0.2
6 nov. 2026	221 factures de vente (janvier à novembre) importées dans le vrai fichier ; pages web instantanées ; **Sage gardé ouvert pour les saisies de la journée** ; contrôle « Déjà au compte de dépôt ? »	1.0.3
6 nov. 2026	Encaissements sur le serveur (grille de Sage plus petite), ouverture du Sage de la journée fiabilisée, textes longs des tableaux web, fonctions RIA dans la rubrique RIA	1.0.4 à 1.0.6
6 nov. 2026	Tests complets (305 tests, tour de 124 pages web), corrections, documentation à jour	1.0.7

4. Organisation

Rôle	Responsabilité
Propriétaire du marché	Besoins, règles de gestion, validations (« vas-y », confirmations), essais réels
Développement	Code, tests, installateurs, documentation
Copie d'essai Sage	Tous les essais d'écriture avant le vrai fichier

Méthode : une demande → une version livrée avec son installateur, ses tests et sa documentation ; règles du propriétaire notées dans le projet et appliquées partout.

5. Risques suivis

Risque	Mesure
Sage sans API ouverte	Import par l'outil officiel, saisies par les fenêtres de Sage, vérification dans la base
Écriture dans le vrai fichier par erreur	Fichier d'import distinct (copie d'essai) tant que non validé
Double import, double encaissement	Contrôle de présence avant et après chaque écriture
Service de connexion de Sage arrêté	Message clair ; lecture de secours
Données réelles dans le dépôt public	`.gitignore`, contrôle avant chaque envoi
Installation bloquée sur un serveur (Sage sur SERVDC01)	Nouveau serveur SERVDCSAGE ; adresses réglées dans la configuration
Deux serveurs qui traitent les mêmes ventes	Retirer la tâche et le serveur web de l'ancien serveur à la mise en service

Risque	Mesure
Sage gardé ouvert qui bloque l'entreprise	Refermé la nuit, avant chaque import et à la sortie ; jamais l'outil d'import pendant la journée ; `[sage] garder_ouvert = false` pour revenir en arrière
Écran du serveur différent de la copie d'essai (taille des fenêtres de Sage)	Positions calculées d'après la fenêtre réelle ; photo de diagnostic à chaque échec
